

Handoff para Codex

Projeto: Linha de Balanco / Planejamento Integrado de Obras

Gerado em 2026-07-02. Este PDF consolida as decisoes da conversa, requisitos, arquivos enviados, prototipos e proximos passos para o Codex.

1. Como compartilhar com o Codex

- Envie este PDF ao Codex junto com o pacote ZIP `codex_handoff_linha_balanco.zip`.
- No Codex, anexe tambem o zip `source/linha-balanco-planejamento-v02-completo.zip` se for trabalhar diretamente no codigo.
- Cole o conteudo de `PROMPT_PARA_CODEX.md` como instrucao inicial.
- Peça primeiro para rodar `npm install`, `npm run build`, identificar erros e corrigir sem remover funcionalidades.

2. Visao geral do produto

O sistema deve ser um PWA/web app para planejamento integrado de obras. O longo prazo e o cronograma-mae; o medio prazo abre lotes e pondera sublotes; o curto prazo mede microservicos; os resultados retroalimentam o longo prazo, compras e fisico-financeiro.

Longo prazo -> Medio prazo -> Curto prazo -> Medicao -> Retroalimentacao -> Compras / Financeiro / Dashboard

3. Modulos

Modulo	Funcoes esperadas
Projetos	Cards de obras, selecao de projeto, imagem, endereco, area, status.
Dashboard	Resumo de progresso, compras pendentes, curto prazo e alertas.
Cronograma / Importacao	XLSX/CSV/XML, tabela editavel, V00/V01/V02, baseline, restauracao e comparacao.
Linha de balanco	Visualizador/editor com drag, resize, dependencias FS, marcos, zoom, linhas fixas.
Compras	Kanban + cobertura por quantidade + importacao das abas de requisicoes.
Medio prazo	Matriz semanal, abertura de lotes/sublotes, pesos e produtividade.
Curto prazo	Microservicos ponderados, medicao e retroalimentacao.
Fisico-financeiro	Avanco fisico x valor, vinculo com EAP/orcamento.

4. Linha de balanco - requisitos essenciais

- Barras por lote-mae, lote, pacote e familia.
- Arrastar horizontalmente para alterar datas mantendo duracao.
- Alca direita para redimensionar duracao.
- Toque longo em tablet para iniciar vinculo FS e impedir menu nativo do navegador.
- Arraste vertical para criar predecessor/sucessor.
- Dependencias desenhadas entre barras.
- Marcos no corpo do cronograma, com linha vertical e texto vertical.
- Zoom proximo: semanas S1, S2, S3 referenciadas ao inicio do projeto + data da semana.
- Zoom medio: meses e semanas mais espacadas.
- Zoom aberto: mes e indice M1, M2, M3.
- Linhas por lote-mae: todos os filhos de TORRE-PAVIMENTOS usam o mesmo numero de linhas.

- Linha fixa por pacote/familia: ALVENARIA, INSTALACOES etc. nao devem pular de linha ao arrastar.

5. Versionamento de prototipos

Versao	Arquivo	Funcionalidade chave
v1	previa_motor_linha_balanco.html	Primeiro motor visual com grupos, locais, zoom, filtros, baseline e drawer.
v2	previa_motor_linha_balanco_v2_drag_config.html	Drag horizontal e painel de configuracoes.
v3	previa_motor_linha_balanco_v3_resize_dependencias.html	Resize de duracao e dependencias FS por arraste.
v4	previa_motor_linha_balanco_v4_tablet_longpress.html	Toque longo em tablet e bloqueio de context menu.
v5	previa_motor_linha_balanco_v5_zoom_marcos.html	Zoom hierarquico e marcos verticais no corpo.
v6	previa_motor_linha_balanco_v6_linhas_fixas.html	Linhas por lote-mae e linha fixa por pacote/familia.

6. Dados e Supabase

Banco recomendado: Supabase/Postgres, pois o projeto e relacional: versoes, tarefas, dependencias, lotes, compras, microservicos, medicoes e financeiro. Firestore pode continuar no curto prazo atual enquanto houver integracao gradual.

- projects
- schedule_versions
- schedule_imports
- schedule_tasks
- line_balance_settings
- milestones
- schedule_dependencies
- change_log
- procurement_cards
- procurement_requirements
- procurement_external_lines
- medium_plan_tasks
- microservice_items
- budget_items
- financial_forecast

7. Compras - regras da planilha

Arquivo enviado: REQUISIÇÕES POR NÍVEL.xlsx. Foram geradas amostras CSV por aba para o Codex ler sem depender do Excel.

Aba	CSV	Linhas exportadas	Colunas	Cabecalho parcial
Solicitações	Solicita_es.csv	500	9	00650 - PIEMONTE P78 CARNEIRO LOBO SPE LTDA, , Requisição d
Approvo ocorrências	Approvo_ocorr_ncias.csv	500	11	Número do documento, Ação, Data/Hora, Aprovador, Motivo da operaç
Approvo documentos	Approvo_documentos.csv	500	15	Concat, , Número, Tipo de documento, Data, Status, Valor (R\$), Filial
Follow solicitação	Follow_solicita_o.csv	500	50	
Controle	Controle.csv	500	21	, , , , , , ,
Follow PEdidos	Follow_PEdidos.csv	500	29	concatpedido, Filial, Nome Filial, Número do pedido, Série, Nr.Processo

Regra critica: pedido existente nao significa compra concluida. Exemplo: se a necessidade e 1000 sacos e o pedido e 50, cobertura = 5%, status real = Parcial/Pendente.

8. Medio prazo e curto prazo

Medio prazo

Abrir lote-mae em sublotes. Exemplo: FACHADA -> Fachada A -> Balancim 1/2/3. Cada filho tem peso e a soma precisa fechar 100%. A tela deve ser matriz semanal com atividades no cruzamento lote x semana.

Curto prazo



Microservicos por criterio de pagamento. Exemplo ALVENARIA: Marcacao 20%, Elevacao 80%. Se Marcacao = 100% e Elevacao = 50%, avanco consolidado = 60%.

9. Arquivos enviados e referencias


Arquivo	Como o Codex deve usar
Cronograma Longo prazo Nizza V00 (Término Cliente).pdf	Usar como referencia visual e de estrutura de grupos/lotes; nao usar PDF como importador principal.
REQUISIÇÕES POR NÍVEL.xlsx	CSV samples extraídos por aba em csv_requisicoes_por_nivel/; usar para construir importador de compras.
Captura de tela 2026-07-01 223750.png	Tela modelo de seleção/projetos/dash do app atual.
Captura de tela 2026-07-01 223837.png	Tela modelo de cronograma/tabela/importacao do app atual.
previa_motor_linha_balanco_v6_linhas_fixas.html	Referencia de comportamento do visualizador; converter fielmente para React.
linha-balanco-planejamento-v02-completo.zip	Base atual para evoluir; comparar com prototipos HTML para corrigir gaps.

10. Referencias visuais enviadas


Captura de tela 2026-07-01 204152.png

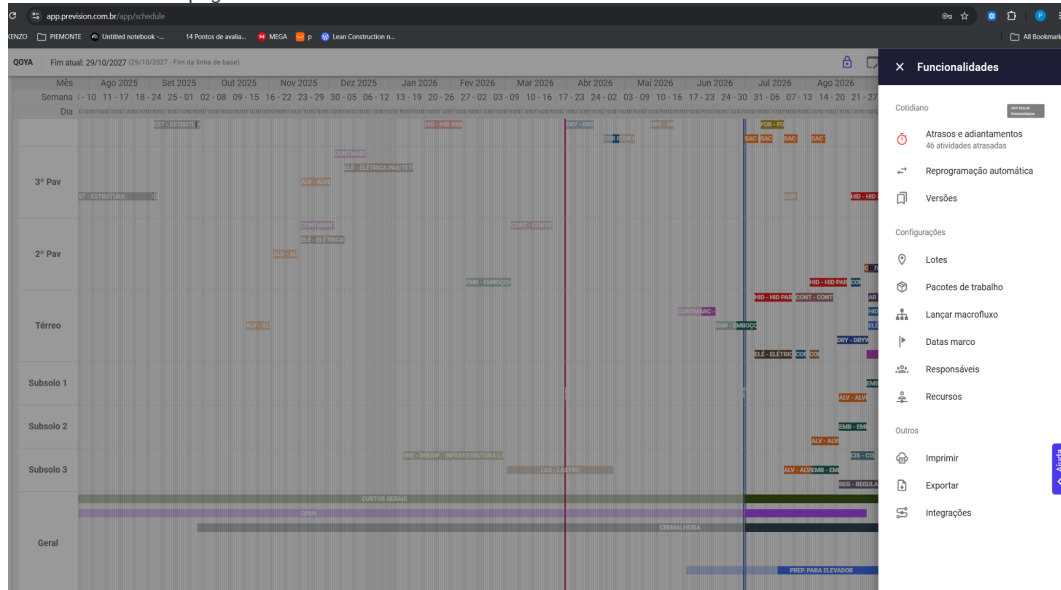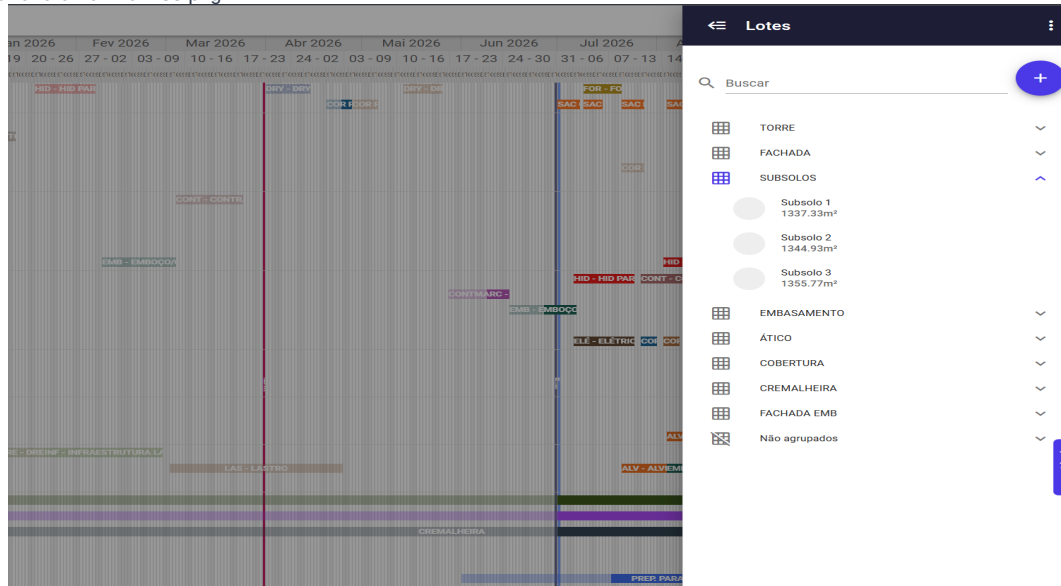Captura de tela 2026-07-01 204233.png

Captura de tela 2026-07-01 204243.png

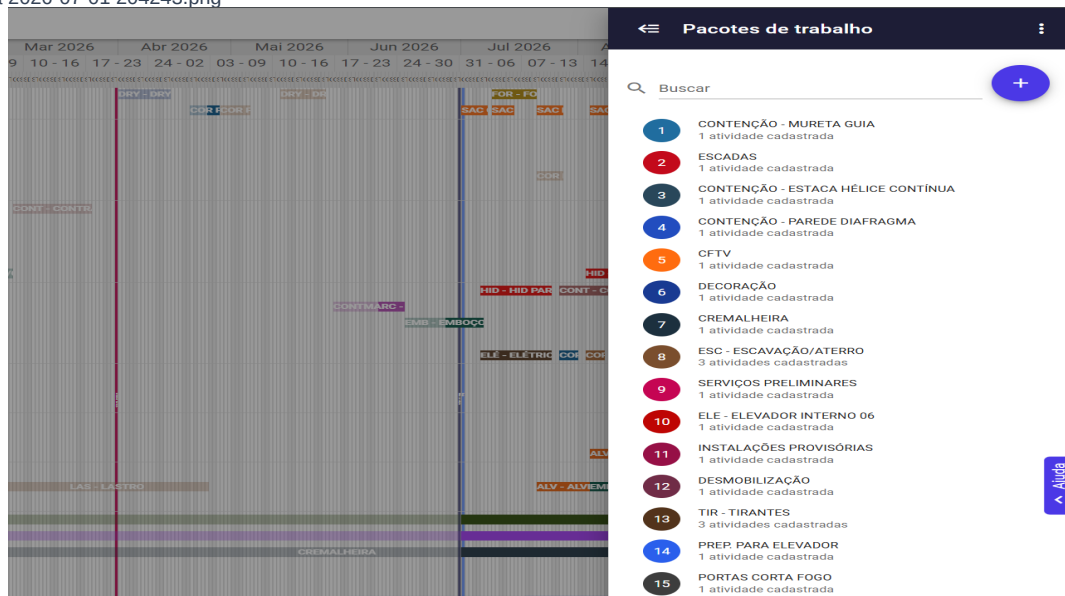

Captura de tela 2026-07-01 204259.png

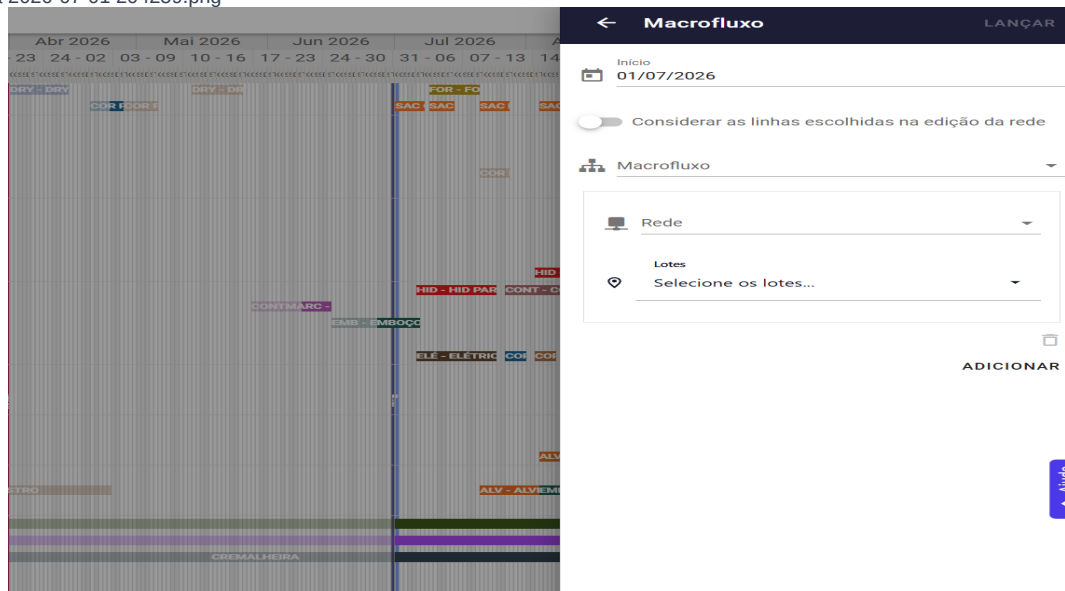

11. Prompt sugerido para Codex

Voce e o Codex trabalhando no projeto Linha de Balanco / Planejamento Integrado de Obras.

Leia primeiro:

1. CODEX_HANDOFF.md
2. codex_file_manifest.json
3. source/linha-balanco-planejamento-v02-completo.zip
4. csv_requisicoes_por_nivel/*.csv

Objetivo imediato:

- Fazer o projeto React/Vite compilar sem erros.
- Portar fielmente as funcoes do prototipo v6 da linha de balanco para React.
- Manter tudo funcionando em modo local/demo antes de conectar Supabase.
- Depois conectar Supabase para persistir tarefas, dependencias, configuracoes e change_log.

Nao simplifique o visualizador removendo interacoes ja validadas. As funcoes obrigatorias estao listadas no PDF/Ma

12. Checklist de aceite

- npm install e npm run build sem erros.
- Linha de balanco funciona em modo local/demo sem Supabase.
- Arrastar atividade nao muda linha visual do pacote.
- Resize altera fim e duracao.
- Toque longo cria modo vinculo e dependencia FS.
- Configuracoes de linhas por lote-mae e familia persistem localmente e depois no Supabase.
- Importador de compras calcula cobertura por quantidade.
- Pesos do medio prazo fecham 100%.
- Microservicos do curto prazo consolidam progresso corretamente.
- Toda alteracao persistida no Supabase gera change_log.
